REVISIONE 3 · PROPOSTA DI PROGETTO

# WALKING PROGRAM PIATTAFORMA & SITO

Data · **13 ottobre 2026** Validità · **30 giorni** Riferimento · **documento “web dev features”**

Preparato da · **Ready2Digital** per **Walking Program**

| 2 fasi | Sett. 14 | Sett. 21 | 22.000 € |
|---|---|---|---|
| vendere, erogare e certificare; poi rete e comunicazione | go-live previsto della Fase 1, diplomi compresi | completamento previsto del progetto | + IVA, corrispettivo complessivo per le due fasi |

## 01 SINTESI: DAL SITO CON E-COMMERCE ALLA PIATTAFORMA FORMATIVA

La proposta iniziale prevedeva un sito per presentare Walking Program e vendere corsi ed eventi. Con le nuove funzionalità richieste, il progetto evolve in una **piattaforma formativa con funzioni LMS**.

> **LMS – Learning Management System**, cioè un sistema per organizzare, distribuire e gestire la formazione online.

È un ambiente in cui gli utenti possono acquistare corsi, accedere a video e materiali riservati e scaricare i propri diplomi, mentre lo staff gestisce contenuti, iscritti, abilitazioni e approvazioni. Nella seconda fase si aggiungono crediti, livelli, ranking e gestione delle palestre affiliate.

Il vantaggio è concreto: **acquisto, accesso alla formazione e certificazione vengono gestiti all’interno dello stesso sistema**, riducendo i passaggi manuali tra strumenti diversi. Ogni iscritto ha un’unica storia di acquisti, accessi e diplomi, consultabile dallo staff e dall’interessato.

Le funzioni LMS comprese sono quelle descritte in questo documento: accesso riservato a video e manuali, gestione di iscritti e abilitazioni, emissione e approvazione dei diplomi. Quiz, esami online, tracciamento del completamento delle lezioni e lo standard SCORM non fanno parte di questa piattaforma.

Questa evoluzione amplia il perimetro della prima proposta. Per questo il lavoro è organizzato in **due fasi**: la prima mette online il ciclo completo, dall’acquisto al diploma; la seconda costruisce su questa base la rete di trainer e palestre e gli strumenti di comunicazione.

GO-LIVE PREVISTO ENTRO LA SETTIMANA 14

### Fase 1 · Vendere, erogare e certificare

- Sito, design e contenuti in italiano
- Catalogo di corsi, edizioni ed eventi
- Checkout, account ed email automatiche; biglietti nominativi
- Video e manuali riservati; area personale istruttore
- Pannello amministrativo e migrazione dal sito attuale
- **Diplomi standard e diplomi di certificazione con approvazione del formatore**

COMPLETAMENTO PREVISTO ENTRO LA SETTIMANA 21

### Fase 2 · Sviluppare la rete e la comunicazione

- Crediti, livelli e ranking
- Area palestra e collegamento dei trainer
- Elenco pubblico delle palestre affiliate
- Versione inglese
- Newsletter integrata

## 02 SITUAZIONE ATTUALE E BENEFICI ATTESI

Walking Program vende formazione attraverso un sito **WordPress** con **WooCommerce**, page builder e albo istruttori su campi personalizzati. Dal backup risultano **215 prodotti e varianti**, **260 istruttori** in albo, circa **1.100 ordini** dal 2021 e **246 account cliente**: un'attività reale e continuativa, che oggi si appoggia a passaggi manuali.

| TEMA | OGGI | CON LA NUOVA PIATTAFORMA |
|---|---|---|
| **Erogazione** | Il sito vende l'iscrizione; video, manuali e diplomi passano per altri canali. | L'acquisto abilita video, manuali e diplomi nell'area personale. |
| **Certificazione** | Le approvazioni avvengono fuori dal sito. | Bozza, approvazione del formatore, storico e pubblicazione del diploma nello stesso sistema. |
| **Edizioni** | Ogni edizione si crea duplicando un prodotto e le sue varianti, con rischio di errori su prezzi e posti. | Un corso, più edizioni: date, sedi, prezzi e posti si gestiscono da un unico modulo. |
| **Istruttori** | 260 istruttori in albo, senza un accesso personale. | Area personale con corsi, materiali, diplomi e profilo modificabile. |
| **Prezzi** | Tre plugin sovrapposti per sconti e timer. | Un solo sistema per coupon, tariffe anticipate e prezzi differenziati. |
| **Tecnologia** | Page builder e oltre 25 plugin: pagine lente e aggiornamenti a rischio. | Codice su misura con meno componenti di terze parti: pagine più leggere e manutenzione più controllabile. |
| **Ricerca** | Nessun dato strutturato per i motori di ricerca. | Dati strutturati leggibili da Google e dai motori di ricerca basati su AI. |

**Chi realizza il progetto**
Ready2Digital progetta e sviluppa in codice siti e piattaforme per sport, fitness e formazione, con strumenti moderni e sviluppo assistito dall'AI. Progettazione, verifica e collaudo restano sotto la nostra responsabilità.

**athlonroma.it**
Athlon Club 4.0 · palestre e piscine, Roma

**ronchiverdi.it**
Ronchiverdi Sport Club, Torino

**tcambrosiano.com**
TC Ambrosiano Milano · tennis, padel, pickleball

## 03 FASE 1 – VENDERE, EROGARE E CERTIFICARE

GO-LIVE ENTRO SETT. 14

La Fase 1 mette online il nuovo sito con il ciclo completo della formazione: chi acquista riceve account, conferme e accesso ai contenuti, e scarica il proprio diploma dall'area personale. Lo staff governa tutto dal pannello, comprese le approvazioni dei diplomi di certificazione.

### Dall'acquisto al diploma

1
**Scelta e pagamento**
Corso o evento dal catalogo; pagamento con Stripe o PayPal, anche in 3 rate.

2
**Account automatico**
L'account nasce dall'acquisto; un'email permette di impostare la password.

3
**Conferme e biglietto**
Email di benvenuto, ordine e pagamento. Per le attività in presenza, biglietto nominativo con QR identificativo.

4
**Accesso ai contenuti**
Video e manuali si sbloccano nell'area personale, in automatico o su abilitazione dello staff.

5
**Diploma**
Standard: disponibile secondo le regole di emissione. Certificazione: dopo l'approvazione del formatore.

### Diploma di certificazione con approvazione del formatore

1. **Bozza**
   Il sistema genera il diploma con nome, data e codice, senza renderlo visibile.
2. **Decisione**
   Il formatore trova la richiesta in coda e approva o rifiuta.
3. **Storico**
   Ogni decisione resta registrata con autore e data.
4. **Pubblicazione**
   Il diploma approvato compare nell'area personale, scaricabile in PDF.
5. **Notifica**
   L'utente riceve l'email "diploma disponibile".

### Cosa comprende la Fase 1

**Sito, design e contenuti in italiano**
Nuovo design desktop e mobile per le pagine della sitemap di riferimento; testi scritti da noi; calendario di corsi ed eventi in home.

**Catalogo, corsi, edizioni ed eventi**
Un unico catalogo per corsi on demand, in presenza ed eventi; edizioni con date, sedi, prezzi e posti disponibili.

**Checkout, account ed email automatiche**
Stripe e PayPal, anche in 3 rate; coupon, tariffe anticipate e prezzi differenziati; account creato all'acquisto.

**Biglietti nominativi**
PDF per partecipante con nome, codice univoco e QR identificativo, inviato via email.

**Video e manuali riservati**
Video protetti e manuali PDF visibili solo a chi ha accesso al corso.

**Area personale istruttore**
Corsi acquistati, video, manuali, diplomi e profilo modificabile.

**Pannello amministrativo**
Corsi, edizioni, prezzi, contenuti, accessi, ordini, iscritti e coda delle approvazioni, da form semplici.

**Diplomi standard e di certificazione**
PDF con nome, data e codice univoco; per la certificazione, pubblicazione solo dopo l'approvazione del formatore.

**Migrazione dal sito attuale**
Albo istruttori, catalogo attivo, ordini storici e account cliente, con verifica dell'importazione e redirect dei vecchi indirizzi.

**Marketing e misurazione**
SEO di base, dati strutturati, Google Tag Manager, parametri UTM, template per landing page, cookie e privacy.

**Protezione dei video.** I video sono riprodotti tramite collegamenti protetti e a scadenza: la protezione limita gli accessi non autorizzati e la condivisione dei link, ma non impedisce la registrazione dello schermo. Il dettaglio delle consegne è nella matrice in appendice.

## 04 FASE 2 – SVILUPPARE LA RETE E LA COMUNICAZIONE

COMPLETAMENTO ENTRO SETT. 21

Sulla base della Fase 1, la Fase 2 aggiunge gli strumenti per far crescere la rete di trainer e palestre affiliate, aprire l'offerta digitale al pubblico internazionale e comunicare con gli iscritti usando i dati della piattaforma.

**Crediti, livelli e ranking**
Crediti attribuiti secondo le regole fornite da Walking Program; livello attuale, livello successivo e crediti mancanti; ranking calcolato in automatico.

**Area palestra e collegamento dei trainer**
Area riservata per la palestra con profilo e trainer collegati; il trainer opera da solo o chiede il collegamento a una palestra, che lo approva.

**Elenco pubblico delle palestre affiliate**
Pagina pubblica con elenco e ricerca per nome e città, alimentata dai profili delle palestre.

**Versione inglese**
Sito in inglese con catalogo di soli corsi on demand ed eventi, per navigazione e vendita; traduzioni scritte da noi.

## Newsletter integrata: prima versione

### Comunicazioni mirate dal pannello, con i dati della piattaforma

Il modulo è integrato nel pannello di gestione e usa i dati di iscritti, acquisti ed eventi; per l'invio si appoggia a **SendGrid**, lo stesso servizio delle email automatiche.

COSA COMPRENDE

- Template grafici prestabiliti, coerenti con il sito
- Modifica di testi, immagini e collegamenti all'interno dei template
- Segmenti concordati, basati sui dati disponibili (ad esempio livello, regione, corso acquistato, evento)
- Anteprima, invio di prova e programmazione
- Invio tramite SendGrid
- Registrazione nella scheda utente degli eventi resi disponibili da SendGrid (consegne, aperture, clic, disiscrizioni)
- Report essenziali per campagna
- Gestione di consensi e disiscrizioni

COME È DEFINITA QUESTA VERSIONE


Il modulo copre le comunicazioni periodiche dello staff. Non è una piattaforma di email marketing generalista, quindi non comprende:

- un editor visuale universale, paragonabile a quello di una piattaforma dedicata
- un costruttore libero di segmentazioni e regole complesse
- workflow in più passaggi
- lead scoring
- A/B test
- automazioni comportamentali avanzate

## 05 TEMPI, MILESTONE E MATERIALI NECESSARI

SETTIMANE DALLA FIRMA

Il calendario previsto porta online la **Fase 1 entro la settimana 14** e completa il progetto **entro la settimana 21**. I 60 giorni della prima proposta si riferivano al solo sito con catalogo e checkout; il calendario attuale tiene conto del perimetro ampliato. Le date sono subordinate alla consegna dei materiali e alle approvazioni indicate sotto.

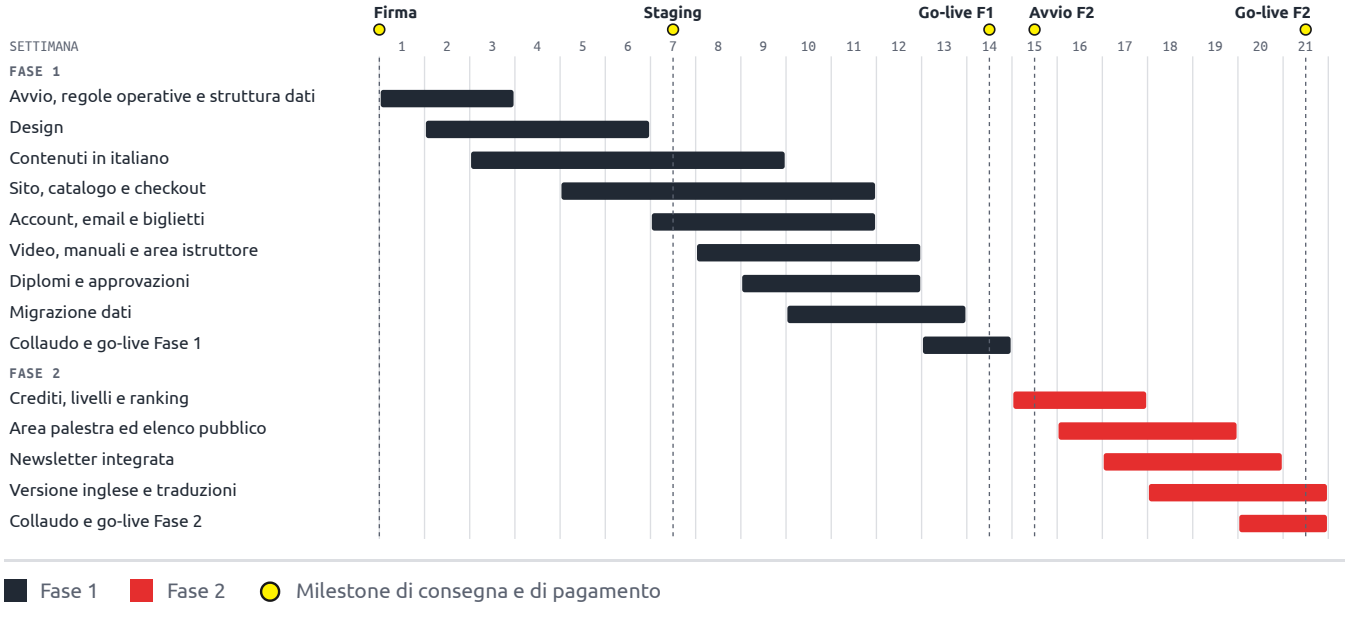

## Cosa serve da Walking Program, e quando

| MATERIALE O DECISIONE | ENTRO SETT. | A COSA SERVE |
|---|---|---|
| **Logo, materiali di brand e foto** | 2 | Base del nuovo design |
| **Decisioni sulle regole operative di Fase 1 (riquadro sotto), comprese le regole di emissione dei diplomi** | 3 | Struttura di catalogo, checkout, accessi e diplomi |
| **Approvazione del design** | 4–6 | Sblocca lo sviluppo delle pagine |
| **Accesso a Stripe e PayPal Business** | 5 | Configurazione dei pagamenti e delle rate |
| **Modelli grafici e contenuti dei diplomi; elenco dei formatori approvatori** | 8 | Generazione dei diplomi e coda di approvazione |
| **Video e manuali dei corsi on demand** | 8 | Test di erogazione e protezione |
| **Revisione dei testi in italiano** | 9 | Pubblicazione dei contenuti |
| **Backup aggiornato del sito attuale** | 10 | Migrazione e verifica dei dati |
| **Regole di crediti e livelli; elenco delle palestre affiliate** | 15 | Avvio della Fase 2 |
| **Segmenti della newsletter da attivare** | 16 | Configurazione del modulo newsletter |
| **Revisione delle traduzioni in inglese** | 19 | Chiusura della Fase 2 |

Ipotesi di calendario: feedback e approvazioni entro 3 giorni lavorativi. Un ritardo nelle consegne indicate sposta le date successive di pari durata.

### REGOLE DA CONFERMARE IN AVVIO

GIÀ PREVISTO

- **Diploma standard:** ipotesi attuale di emissione all'acquisto, come indicato nella specifica. Da confermare.
- **Diploma di certificazione:** pubblicato solo dopo l'approvazione del formatore.
- **Biglietto:** PDF nominativo con QR identificativo. Scansione, validazione e check-in all'ingresso non sono inclusi.
- **Formazione:** nessun quiz, nessuna verifica dell'apprendimento e nessun tracciamento obbligatorio della visione dei video.

DA DECIDERE INSIEME

- Acquirente e partecipante coincidono sempre o possono essere persone diverse?
- Si possono acquistare più posti? Come si raccolgono i nominativi dei partecipanti?
- Per quanto tempo restano attivi gli accessi ai corsi?
- Che effetto hanno annullamenti e rimborsi su accessi, crediti e diplomi?
- In quale momento si assegnano i crediti?
- Quali sono le regole di emissione dei diplomi?
- Le certificazioni hanno una scadenza?

Ogni decisione va presa prima dello sviluppo delle funzioni interessate, secondo le date della tabella. Le scelte che ampliano il perimetro descritto saranno valutate separatamente.

## 06 INVESTIMENTO E PAGAMENTI

Il corrispettivo è complessivo e riferito all'**affidamento congiunto delle due fasi**. Comprende tutto il perimetro descritto nelle sezioni 3 e 4 e nella matrice in appendice, la formazione dello staff e 30 giorni di assistenza dopo ciascun go-live. L'eventuale affidamento di una sola fase sarà oggetto di una proposta dedicata.

| TOTALE PROGETTO, IVA ESCLUSA | IVA 22% | TOTALE IVA INCLUSA |
|---|---|---|
| 22.000 € | 4.840 € | 26.840 € |

### Modalità di pagamento

| MILESTONE | PREVISTO | PERCENTUALE | IMPORTO IVA ESCLUSA |
|---|---|---|---|
| **Firma della proposta** | sett. 0 | 30% | 6.600 € |
| **Staging con catalogo e checkout funzionanti** | sett. 7 | 20% | 4.400 € |
| **Go-live della Fase 1** | sett. 14 | 20% | 4.400 € |
| **Avvio della Fase 2** | sett. 15 | 15% | 3.300 € |
| **Go-live della Fase 2** | sett. 21 | 15% | 3.300 € |
| **Totale** | | 100% | 22.000 € |

L'IVA al 22% si aggiunge a ogni fattura. Le settimane indicano il calendario previsto. I costi ricorrenti dopo il go-live sono descritti nella sezione 7 e non sono compresi nel corrispettivo.

## 07 GESTIONE SUCCESSIVA, INCLUSIONI E CONFINI

**Già incluso nel progetto:** 30 giorni di assistenza dopo ciascun go-live, per correggere eventuali malfunzionamenti e accompagnare lo staff nelle prime settimane di utilizzo. Dopo questo periodo, i servizi continuativi si articolano in tre componenti distinte.

### A Infrastruttura e manutenzione tecnica

Hosting (Vercel), database e accessi (Supabase), video (Bunny Stream), email (SendGrid), dominio; backup, monitoraggio, aggiornamenti e manutenzione.

Volumi e livelli di servizio da definire. Il codice su misura riduce i componenti da aggiornare, ma librerie, servizi esterni e sicurezza vanno comunque seguiti nel tempo.

### B Assistenza operativa

Eventuale supporto allo staff, caricamento dei materiali e gestione delle richieste degli utenti (accessi, password, pagamenti).

Il perimetro dipende dalle responsabilità che resteranno a Walking Program e da quelle affidate a noi.

### C Evoluzioni

Nuove funzionalità e modifiche successive al perimetro di questa proposta.

Quotate separatamente, su richiesta.

**Prima della firma** formalizzeremo il costo ricorrente e le condizioni di servizio delle componenti A e B, così che Walking Program possa valutare l'impegno economico complessivo. Le commissioni di Stripe e PayPal, comprese quelle del pagamento in 3 rate, restano a carico di Walking Program perché legate al suo conto di incasso.

## Consegne: cosa realizziamo, cosa inseriamo, cosa gestirete voi

### Realizzazione dei template

- Design delle pagine della sitemap di riferimento (appendice), desktop e mobile
- Template di scheda corso, edizione ed evento, landing page, email, diplomi, biglietti e newsletter
- **Un giro di revisione** sul design, uno sui testi in italiano e uno sulle traduzioni in inglese

### Inserimento iniziale

- Testi delle pagine della sitemap, in italiano e poi in inglese
- Catalogo attivo e dati migrati dal sito attuale
- Video e manuali forniti, per il collaudo dell'erogazione; le quantità da caricare al lancio saranno concordate

### Gestione autonoma

- Dopo il go-live lo staff crea e aggiorna corsi, edizioni, eventi, contenuti, landing page e newsletter dal pannello
- Formazione dello staff inclusa
- Il template per landing page permette di crearne di nuove in autonomia; la produzione di landing e testi ulteriori non è compresa

## Impegni verificabili e confini

### Impegni

- **Migrazione:** importiamo i dati elencati nel perimetro (albo istruttori, catalogo attivo, ordini storici, account cliente) a partire dagli archivi del sito attuale. Il risultato dipende dalla disponibilità e dalla qualità degli archivi sorgente; l'importazione viene verificata insieme prima del go-live. Gli account migrati reimpostano la password al primo accesso.
- **Ricerca:** redirect 301 dai vecchi indirizzi, SEO di base e dati strutturati, per agevolare la continuità dell'indicizzazione. Posizionamento e visibilità su motori di ricerca e motori AI dipendono anche da fattori esterni e non possono essere garantiti.
- **Rate PayPal:** il pagamento in 3 rate dipende dall'abilitazione di "Paga in 3 rate" sul conto di Walking Program e dai limiti di importo previsti da PayPal.

### Non compreso

- Produzione e montaggio dei video
- Quiz, esami online, tracciamento del completamento delle lezioni, standard SCORM
- Scansione, validazione e check-in dei biglietti
- Blog; lingue diverse da italiano e inglese
- Integrazione con piattaforme esterne di marketing automation e funzioni newsletter oltre la prima versione
- Revisioni oltre il giro previsto per design, testi e traduzioni
- Produzione di landing page e testi oltre a quanto concordato
- Pubblicità e gestione dei canali social

WALKING PROGRAM · REVISIONE 3 · 13 OTTOBRE 2026 · PROPOSTA VALIDA 30 GIORNI

READY2DIGITAL · MAURIZIO@READY2DIGITAL.IT

# A APPENDICE · MATRICE DEL PERIMETRO

## Sitemap di riferimento

Dalla mappa Octopus condivisa: le pagine incluse sono quelle elencate; nuove pagine o sezioni si concordano a parte.

### Azienda — FASE 1

- Home, con calendario di eventi e corsi
- Chi siamo
- Metodo

### WP Academy Trainer — FASE 1

- Presentazione, Incontra, Unisciti
- Certificazione livello 1, workshop on demand, education events
- Albo istruttori

### Eventi e WP Walker — FASE 1

- Eventi pubblici
- WP Walker e attrezzatura, con richiesta di preventivo

### Reti, media, contatti

- Case studies, Media, Contatti — FASE 1
- Fitness club affiliati, con elenco e ricerca — FASE 2

| AREA | COSA VIENE CONSEGNATO | FASE |
|---|---|---|
| FASE 1 · VENDERE, EROGARE E CERTIFICARE | | |
| **Avvio** | Conferma delle regole operative; struttura dei dati di corsi, edizioni, ordini, utenti, ruoli, contenuti e diplomi | 1 |
| **Design** | Sistema grafico, home e template di pagina, desktop e mobile; un giro di revisione | 1 |
| **Sito** | Pagine della sitemap di riferimento; calendario di eventi e corsi in home; liste separate per istruttori e non istruttori, con etichette in presenza / digitale | 1 |
| **Contenuti** | Testi in italiano per le pagine della sitemap, scritti da noi; un giro di revisione | 1 |
| **Catalogo** | Catalogo unico per corsi on demand, corsi in presenza ed eventi; edizioni con date, sedi e prezzi; limite di posti e biglietti vendibili | 1 |
| **Checkout** | Stripe e PayPal; pagamento in 3 rate con PayPal per i prodotti idonei; coupon, tariffe anticipate con timer, prezzi differenziati (ad esempio tesserati e non) | 1 |
| **Account** | Account creato all'acquisto, email per impostare la password, login e recupero password | 1 |
| **Email automatiche** | Benvenuto e attivazione, conferma ordine, pagamento riuscito, diploma disponibile; template coerenti con la grafica | 1 |
| **Biglietti** | Biglietto PDF per partecipante con nome, cognome, codice univoco e QR identificativo, inviato via email | 1 |
| **Video e manuali** | Caricamento dei video dal pannello; riproduzione protetta solo per chi ha accesso; manuali PDF in spazio privato; accesso automatico all'acquisto o manuale | 1 |
| **Area istruttore** | Dashboard, I miei corsi con video e manuali, diplomi, profilo modificabile (foto, nome, palestra, città, Paese, biografia, email, lingua) | 1 |
| **Pannello admin** | Corsi, edizioni, eventi, prezzi, coupon e posti; caricamento di video e PDF; abilitazioni; ordini e partecipanti; albo istruttori; richieste di preventivo; coda di approvazione dei diplomi | 1 |
| **Diplomi standard** | PDF con nome, data e codice univoco, scaricabile dall'area personale; emissione secondo le regole confermate in avvio | 1 |
| **Diplomi di certificazione** | Generazione della bozza; approvazione o rifiuto del formatore; storico della decisione; pubblicazione del diploma approvato; notifica all'utente | 1 |
| **WP Walker** | Modulo di richiesta preventivo con invio email e archivio delle richieste nel pannello | 1 |
| **Marketing e SEO** | SEO di base, dati strutturati, cookie banner e privacy policy, Google Tag Manager, parametri UTM, template per landing page | 1 |
| **Migrazione** | Albo istruttori, catalogo attivo, ordini storici consultabili, account cliente con reimpostazione della password; redirect 301; verifica dell'importazione | 1 |
| **Collaudo** | Test completi, formazione dello staff, go-live della Fase 1 | 1 |
| FASE 2 · SVILUPPARE LA RETE E LA COMUNICAZIONE | | |
| **Crediti, livelli e ranking** | Crediti secondo le regole fornite da Walking Program; livello attuale e successivo, crediti mancanti; ranking calcolato in automatico e visibile in dashboard | 2 |
| **Area palestra** | Ruolo palestra con area riservata (profilo, trainer collegati); trainer singolo o collegato, con richiesta e approvazione del collegamento | 2 |
| **Palestre affiliate** | Pagina pubblica con elenco e ricerca per nome e città | 2 |
| **Dati iniziali** | Import e verifica dei dati forniti su palestre, crediti pregressi e ranking iniziale | 2 |
| **Versione inglese** | Sito in inglese con catalogo di soli corsi on demand ed eventi, per navigazione e vendita; traduzioni scritte da noi, un giro di revisione | 2 |
| **Newsletter** | Prima versione del modulo integrato, come descritta nella sezione 4 | 2 |
| **Collaudo** | Test completi, formazione dello staff, go-live della Fase 2 | 2 |
